Comune di Parma

PISTA CICLABILE "PARMA - ALBERI DI VIGATTO"

CIG B8E8F11020


REDAZIONE DEL DOCFAP E PFTE

IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO I.7 ARTT. 1-2 DEL D.LGS 36/23

ELABORATO:


PFTE

RA.5

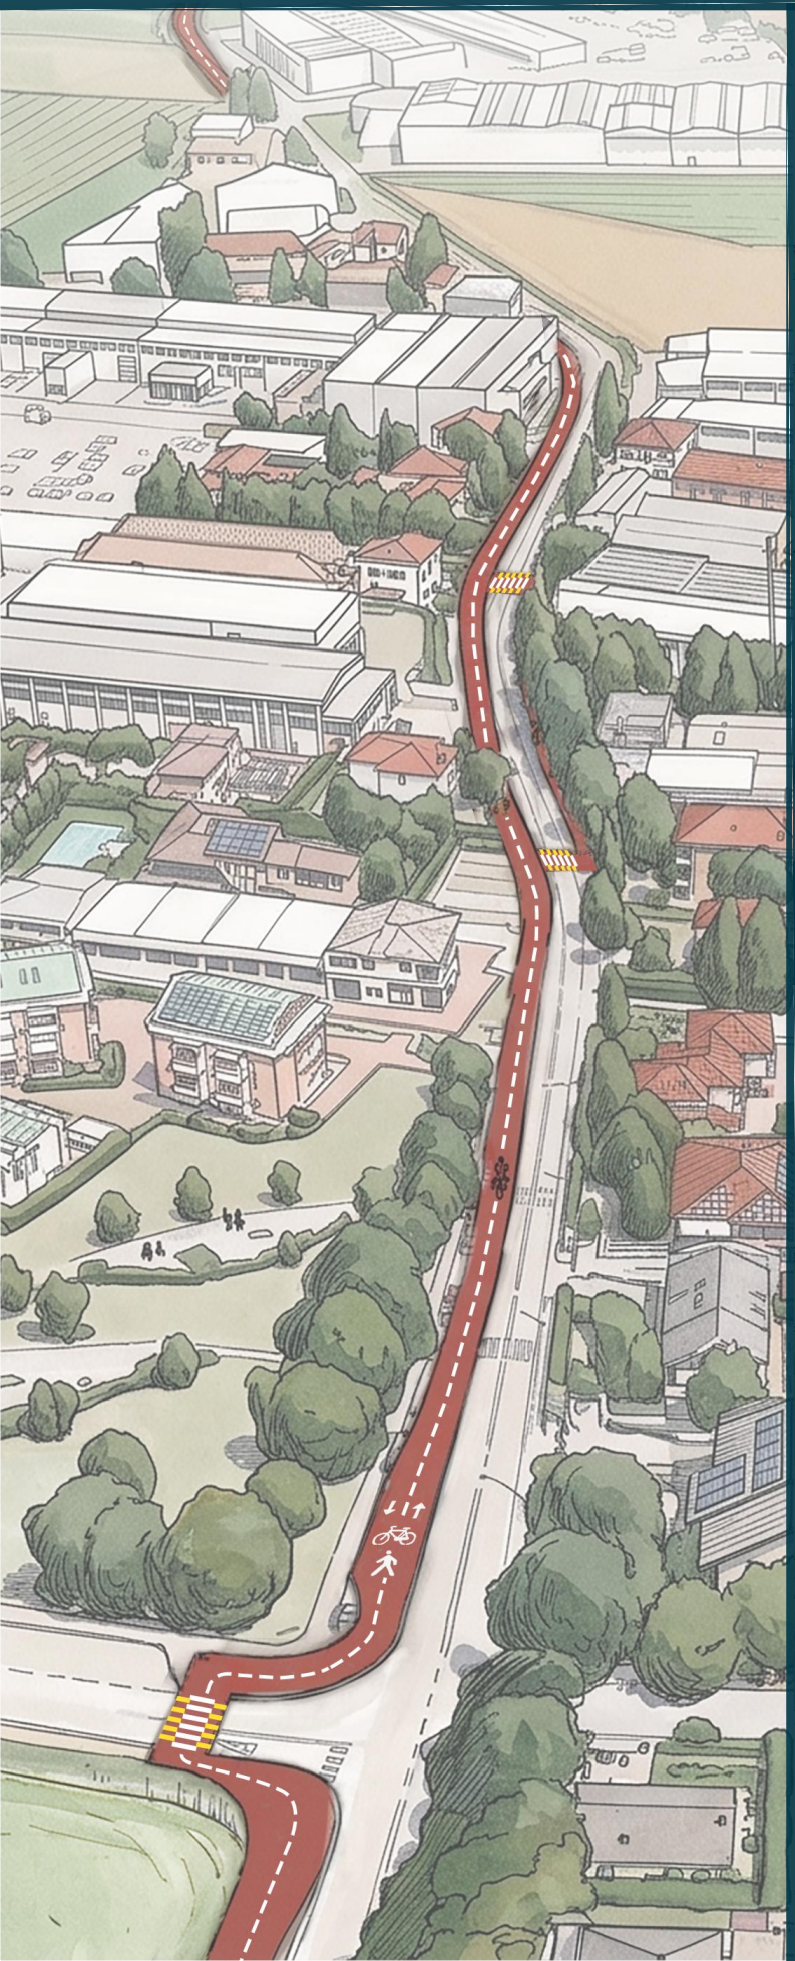



PROGRAMMA LAVORI



PROGETTO:

ING. ROSARIA RAGAZZINI

(Ord. Ing. Prov. PR 1567A)

REV. 01 - DATA 18.09.2026

FASI E SOTTOFASI		ATTIVITA'	u.m.	Quantità	DURATA (Gg. Nat. Cons.)	2027 SETTEMBRE	2027 OTTOBRE	2027 NOVEMBRE	2027 DICEMBRE	2027 GENNAIO	2027 FEBBRAIO	2027 MARZO	2027 APRILE	2027 MAGGIO	2027 GIUGNO	2027 LUGLIO	2027 AGOSTO	2027 SETTEMBRE	2027 OTTOBRE	2027 NOVEMBRE	2027 DICEMBRE	2028 GENNAIO	2028 FEBBRAIO	2028 MARZO	2028 APRILE	2028 MAGGIO	2028 GIUGNO	2028 LUGLIO	2028 AGOSTO	2028 SETTEMBRE	2028 OTTOBRE	2028 NOVEMBRE	2028 DICEMBRE
PROGETTO	0.1	**EFFICACIA PFTE**																														
	0.1.3	VARIANTE URBANISTICA	cad	0	-																											
	0.1.4	APPROVAZIONE PFTE	cad	1	60																											
	0.2	**EFFICACIA PE**																														
	0.2.1	AFFIDAMENTO PE / CSP	cad	1	60																											
	0.2.2	ELABORAZIONE PE	cad	1	60																											
	0.2.3	APPROVAZIONE PE	cad	1	90																											
AFFIDAMENTO	0.3	**PROCEDURE AFFIDAMENTO LAVORI / DL / CSE /COLLAUDI**																														
	0.3.1	AFFIDAMENTO DL /CSE / COLLAUDO TECNICO AMMINISTR.	cad	1	60																											
	0.3.2	PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI	cad	1	120																											
ESPROPRI	0.4	**PROCEDURE ESPROPRIATIVE**																														
	0.4.1	RILIEVI	mq	20114	30																											
	0.4.2	ACCORDI BONARI - DITTE	cad	102	60																											
	0.4.3	FRAZIONAMENTI - DITTE	cad	102	90																											
	0.4.4	ACQUISIZIONE AREE	mq	20114	90																											
LAVORI	1.1	**REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA CICLABILE**																														
	1.1.1	Dim. 2,5m DI NUOVA REALIZZAZIONE - da sez. 1 a sez. 17	m	2330	180																											
	1.1.2	Dim. 2,5m SU PIATTAFORMA ESISTENTE - da sez. 17 a sez. 42	m	608	90																											
	1.1.3	Dim. 1,5m SU PIATTAFORMA ESISTENTE - da sez. 17 a se.z 42	m	400	60																											
	1.2	**ATTREZZATURE E PRESIDI**																														
	1.2.1	ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI / CICLABILI - da sez. 1 a sez. 17	cad	3	9																											
	1.2.2	ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI / CICLABILI - da sez. 17 a sez. 42	cad	8	24																											
	1.2.3	ADEGUAMENTO BANCHINE PRESSO FERMATE BUS - da sez. 1 a sez. 17	cad	3	15																											
	1.2.4	ADEGUAMENTO BANCHINE PRESSO FERMATE BUS - da sez. 17 a sez. 42	cad	7	35																											
	1.2.5	AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA - da sez. 1 sez. 17	cad	4	40																											
	1.2.6	AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA - da sez. 17 sez. 42	cad	2	20																											
	1.3	**TOMBINATURE DI CAVI / CANALI**																														
	1.3.1	Cavo di Vigatto con Scatolare dim. int 1500x1000mm	m	165	10																											
	1.3.2	Fossetti stradali	m	1900	8																											
	1.3.3	Attraversamenti con tubazioni in cls D600mm	m	61	3																											
	1.4	**MANUFATTI**																														
	1.4.1	M1 - Tombinatura scolina muretti di testata	cad	1	5																											
	1.4.2	M2 - Tombinatura scolina muretti di testata	cad	1	5																											
	1.4.3	M3 - Tombinatura scolina muretti di testata	cad	1	5																											
	1.4.4	M4 - Tombinatura scolina muretti di testata	cad	1	5																											
	1.4.5	M5 - Tombinatura scolina muretti di testata	cad	1	5																											
	1.4.6	M6 - Installazione parapetto bordo ponte	cad	1	5																											
	1.4.7	M7 - Tombinatura scolina muretti di testata	cad	1	5																											
	1.4.8	M8 - Manufatto raccordo di valle tratto tombinato cavo di Vigatto	cad	1	5																											
	1.4.9	M9 - Manufatto raccordo di monte tratto tombinato cavo di Vigatto	cad	1	15																											
	1.4.10	M10 - Manufatto di raccordo con tratto tombinato presso sez. 29	cad	1	15																											
	1.5	**GESTIONE DELLE INTERFERENZE**																														
	1.5.1	SEGNALETICA VERTICALE E CARTELLI PUBBLICITARI	m	600	6																											
	1.5.2	PALI P.I.	m	1000	10																											
	1.5.3	LINEE AT - Compartimentazione	cad	1	20																											
	1.5.4	GASDOTTI - Protezione e compartimentazione	m	400	12																											
COLLAUDI	1.6	**COLLAUDI**																														
	1.6.1	Collaudi di impianti PI e reti	cad	1	30																											
	1.6.2	Collaudo tecnico amministrativo	cad	1	90																											
DURATA COMPLESSIVA					**837**	**380**												**365**										**92**			
